

是正前

是正後

NO. 1



1階 多目的ホール
木製建具が枠に擦る

建具のレール位置調整

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影

撮影者 高坂 令和2年3月25日 撮影

NO. 2



1階展示コーナー
床塩ビタイルの膨れ

塩ビタイルの再貼付け

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影

撮影者 高坂 令和2年7月25日 撮影

NO. 3



1階展示コーナー
床塩ビタイルの膨れ

塩ビタイルの再貼付け

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影

撮影者 高坂 令和2年7月25日 撮影

是正前

是正後

<p>NO. 4</p>  <p>1階ホール(2) 床塩ビタイルの膨れ</p> <p>撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影</p>	<p>写真なし</p> <p>塩ビタイルの再貼付け ※床材廃番のため類似品にて協議施工する。</p> <p>撮影者 撮影</p>
<p>NO. 5</p>  <p>1階ホール(2) 床塩ビタイルの膨れ</p> <p>撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影</p>	<p>写真なし</p> <p>塩ビタイルの再貼付け ※床材廃番のため類似品にて協議施工する。</p> <p>撮影者 撮影</p>
<p>NO. 6</p>  <p>1階ホール(2) 床塩ビタイルの膨れ</p> <p>撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影</p>	 <p>塩ビタイルの再貼付け</p> <p>撮影者 高坂 令和2年7月25日 撮影</p>

是正前

是正後

NO. 7




1階ホール(1)
床塩ビタイルの膨れ

塩ビタイルの再貼付け

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影

撮影者 高坂 令和2年7月25日 撮影

NO. 8

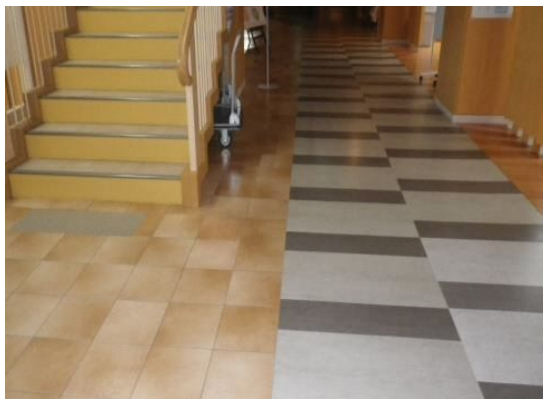

1階ホール(1)
床塩ビタイルの膨れ

塩ビタイルの再貼付け

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影

撮影者 高坂 令和2年7月25日 撮影

NO. 9



1階ホール(1)
床塩ビタイルの膨れ

塩ビタイルの再貼付け

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影

撮影者 高坂 令和2年7月25日 撮影

是正前

是正後

NO. 10



1階ホール(1)
床塩ビタイルの膨れ

塩ビタイルの再貼付け

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影

撮影者 高坂 令和2年7月25日 撮影

NO. 11



1階風除室(1)
壁ボードのひび割れ

化粧ボード張り

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影

撮影者 高坂 令和2年7月25日 撮影

NO. 12



1階風除室(1)
床がアルコール消毒液で変色している

清掃+再防塵塗装

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影

撮影者 高坂 令和2年7月25日 撮影

是正前

是正後

NO. 13



1階ロビー
床塩ビタイルの膨れ

塩ビタイルの再貼付け
※2年目点検にて対応

撮影者 高坂 令和2年7月24日 撮影

撮影者 撮影

NO. 14



1階 ホワイエ
木枠入隅部の隙間

コーク処理及び部分塗装

撮影者 高坂 令和3年3月27日 撮影

撮影者 高坂 令和4年2月5日 撮影

NO. 15



1階ホール出入口
木枠入隅部の隙間

コーク処理及び部分塗装

撮影者 高坂 令和3年3月27日 撮影

撮影者 高坂 令和4年2月5日 撮影

是正前

是正後

NO. 16



1階展示コーナー
壁のテープのり付着(町依頼)

撮影者 高坂 令和3年3月27日 撮影



下地補修及び再塗装仕上げ

撮影者 高坂 令和4年2月20日 撮影

NO. 17



1階玄関ホール
防火スクリーンが床まで落ちない

撮影者 高坂 令和3年3月27日 撮影



仕様の確認と点検調整
※法定点検でのメンテナンス。

撮影者 高坂 令和3年9月11日 撮影

NO. 18



1階町民ロビー・ホール(2)
床の塩ビタイルの膨れ(クラック部)
※1年目点での未済み工事(ホール(2))

撮影者 高坂 令和3年3月27日 撮影




塩ビタイルの貼替

撮影者 高坂 令和4年2月20日 撮影

是正前


是正後

NO. 19

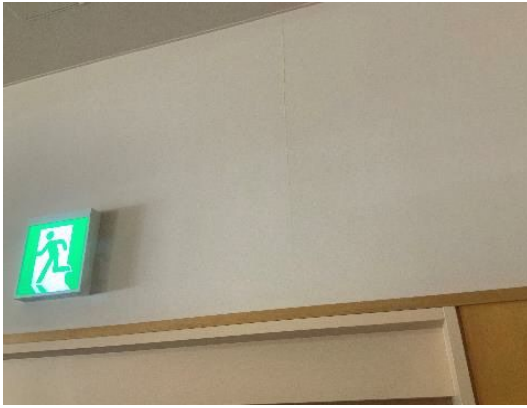

1階執務室
出入口上部壁ボードの割れ

撮影者 高坂 令和3年3月27日 撮影

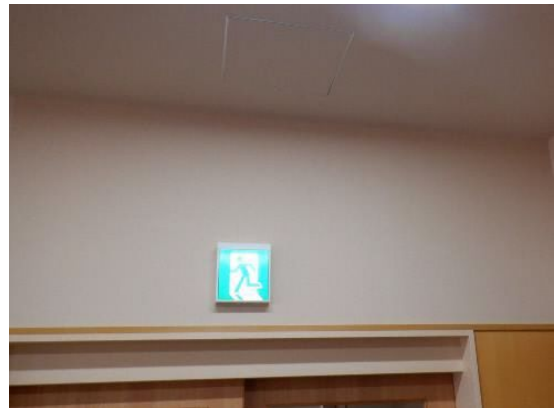

クロス補修+塗装


撮影者 高坂 令和4年2月20日 撮影

NO. 20



1階宿直室
暖房の効きが悪い
室外機の熱交換器よりガス漏れ

撮影者 ダイキン工業 令和3年5月10日 撮影

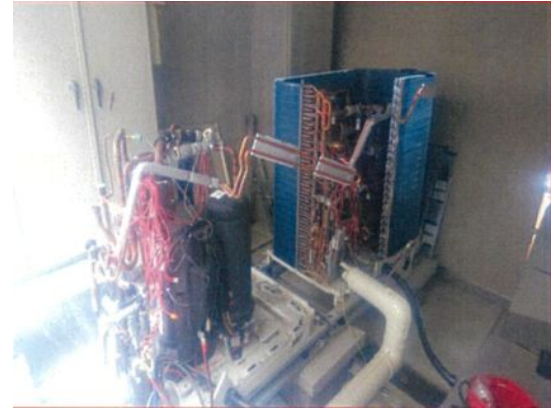

2台室外機部品（熱交換器）交換
※他37台の保全作業

撮影者 ダイキン工業 令和3年5月10日 撮影

NO. 21



1階北出入口
床補修材の剥がれ

撮影者 高坂 令和3年3月27日 撮影



カップ掛けのうえ防塵塗装

撮影者 高坂 令和3年5月10日 撮影

是正前

是正後

NO. 1



2階 議長・副議長室
ドアの締りが早い

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影



ドアクローザーの速度調整

撮影者 高坂 令和2年3月25日 撮影

NO. 2



2階 議場
北面壁の汚れ

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影



壁の清掃


撮影者 高坂 令和2年7月25日 撮影

NO. 3



2階議場
天井に養生テープ

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影



養生テープ撤去

撮影者 高坂 令和2年7月25日 撮影

是正前

是正後

NO. 4



2階廊下(8)
天井ボードビスがない

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影



ビス止め

撮影者 高坂 令和2年7月25日 撮影

NO. 5



2階廊下(8)
柱入隅クロスの剥がれ

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影



再クロス貼付け

撮影者 高坂 令和2年7月25日 撮影

NO. 6



2階ロビー
床フローリングを叩くと軽い音がする

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影



点検済み 現状のまま
直貼りのため不陸により接着剤の厚さの厚薄のため

撮影者 高坂 令和2年7月25日 撮影

是正前

是正後

NO. 7



2階ロビー
壁入隅のクロス剥がれ

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影



再クロス貼付け

撮影者 高坂 令和2年7月25日 撮影

NO. 8



2階事務室
天井部から異音がる

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影



空調フィルターのズレの解消

撮影者 高坂 令和2年7月25日 撮影

NO. 9



2階会議室
4連引き戸の破損

撮影者 高坂 令和2年1月15日 撮影



小口にステンレス補強板取付
※対応済

撮影者 高坂 令和2年7月25日 撮影

是正前

是正後

NO. 10



2階廊下(5)
建具上部入隅部のすきま

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影



ボンドコークで処理

撮影者 高坂 令和2年7月25日 撮影

NO. 11



2階廊下(5)
巾木取り合い部分の床の色が違う


撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影

町の対応のため
別途

※床ワックスの不良


撮影者 撮影

NO. 12

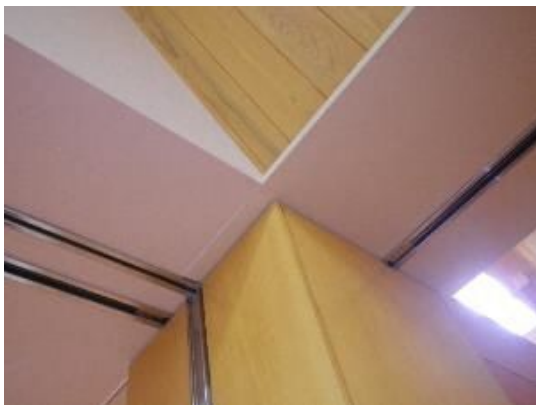

2階ロビー
シャッター取り合い部の壁の隙間

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影

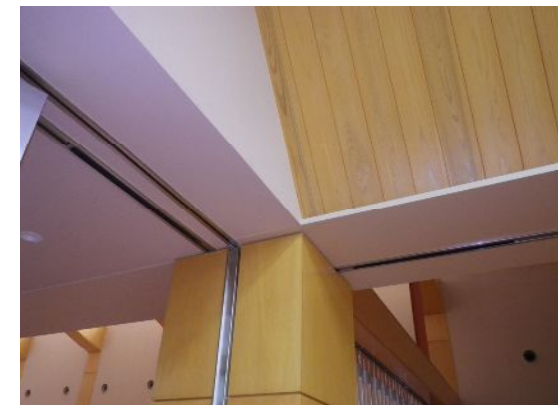

ボンドコークで処理

撮影者 高坂 令和2年7月25日 撮影

是正前

是正後

NO. 13



2階206会議室
壁下クロスのしわ

部分貼替及び再塗装

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影

撮影者 高坂 令和2年7月25日 撮影

NO. 14



写真なし


2階206会議室
換気を回すと異臭がする
暖房運転でも空調の効きが悪い

調査及び調整・調整済み

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影

撮影者 高坂 令和2年7月25日 撮影

NO. 別

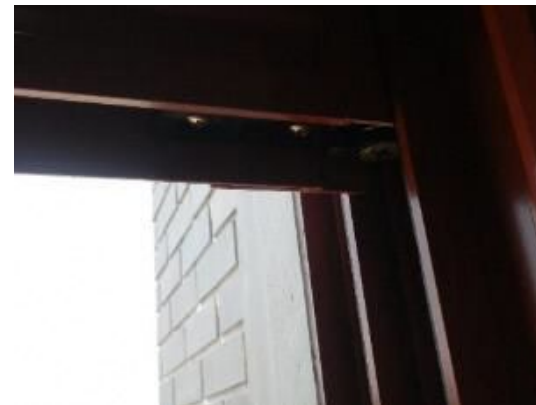

2階事務室
上げ下げ窓のストッパーが弱く窓が下がる

点検再調整

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影

撮影者 高坂 令和2年7月25日 撮影

是正前

是正後

NO. 別



2階事務室
空調の送风口が結露する。
防湿テープ設置済み


撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影



高湿度間欠運転設定にて再調整済み
防湿テープ設置


撮影者 高坂 令和2年8月19日 撮影

NO. 15

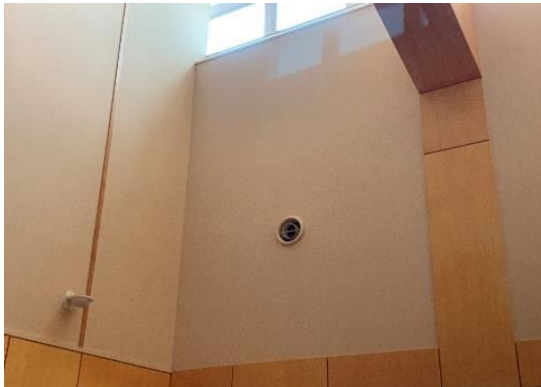

2階 廊下
吹き抜け部壁ボードのひび割れ
※地震の影響による

撮影者 高坂 令和3年3月27日 撮影

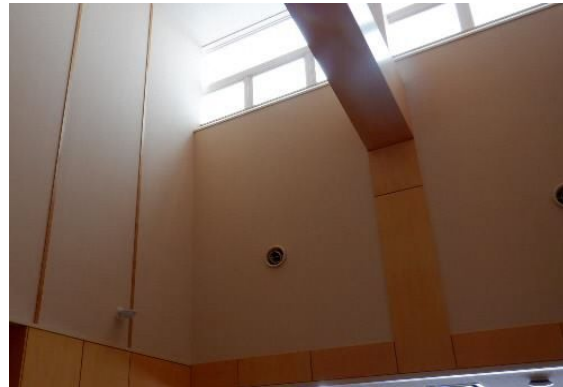

クロス補修+塗装

撮影者 高坂 令和4年2月20日 撮影

NO. 16



2階 ロビー
天井廻り縁の隙間
※地震の影響による

撮影者 高坂 令和3年3月27日 撮影



コーク処理+塗装

撮影者 高坂 令和4年2月5日 撮影

是正前

是正後

NO. 17



2階 執務室
換気扇廻りの結露のシミ

撮影者 高坂 令和3年3月27日 撮影



再塗装

撮影者 高坂 令和4年2月5日 撮影

NO. 18

写真なし

2階 町長室
室内で臭気が発生する

撮影者 高坂 令和3年3月27日 撮影

写真なし

検査時は臭気は発生していない。
※洗面所の封水など確認をお願いします。

撮影者 高坂 令和4年2月5日 撮影

NO. 19



2階 廊下
出隅木見切り取合いの隙間

撮影者 高坂 令和3年3月27日 撮影



コーク処理+塗装

撮影者 高坂 令和4年2月20日 撮影

是正前

是正後

NO. 1



風除室（1）出入口外壁
壁の乾燥収縮によるひび割れ

下地処理＋再塗装

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影

撮影者 高坂 令和2年7月25日 撮影

NO. 2




西面外壁
窓開口廻り乾燥収縮によるひび割れ（4ヶ所）

下地処理＋再塗装

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影

撮影者 高坂 令和2年7月25日 撮影

NO. 3

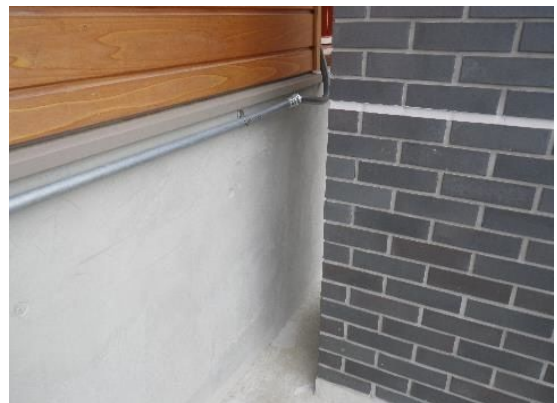

北面外壁
腰壁薄塗材の浮き

下地補修＋部分塗装

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影

撮影者 高坂 令和2年7月25日 撮影

是正前

是正後

NO. 4




北面外壁
腰壁薄塗材の乾燥収縮によるひび割れ

下地補修＋部分塗装

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影

撮影者 高坂 令和2年7月25日 撮影

NO. 5

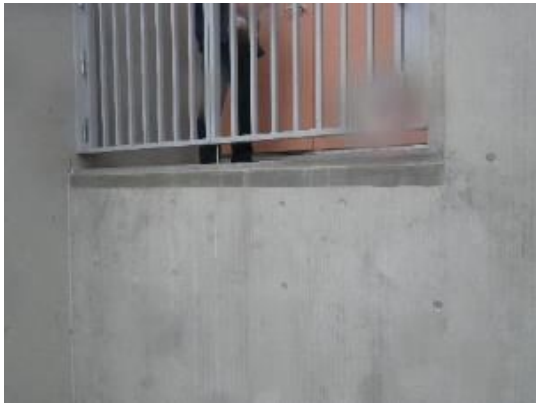

東面外壁
階段部壁天端エフロ（白い液だれ跡）

下地補修＋部分塗装

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影

撮影者 高坂 令和2年7月25日 撮影

NO. 6



東面外壁
腰壁薄塗材の乾燥収縮によるひび割れ

下地補修＋部分塗装

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影

撮影者 高坂 令和2年7月25日 撮影

是正前

是正後

NO. 7



南面外壁
腰壁薄塗材の乾燥収縮によるひび割れ

下地補修+再塗装

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影

撮影者 高坂 令和2年7月25日 撮影

NO. 8



南面外壁
腰壁薄塗材の乾燥収縮によるひび割れ

下地補修+部分塗装

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影

撮影者 高坂 令和2年10月31日 撮影

NO. 9



車寄せ腰壁
腰壁薄塗材の乾燥収縮によるひび割れ

下地補修+再塗装

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影

撮影者 高坂 令和2年11月13日 撮影

是正前

是正後

NO. 10



車寄せ腰壁
腰壁薄塗材の乾燥収縮によるひび割れ

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影



下地補修+再塗装

撮影者 高坂 令和2年7月25日 撮影

NO. 11



南面ホール棟屋根
屋根材がゆがんでいる


撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影



屋根材の撤去及び葺き替え。

撮影者 高坂 令和2年7月25日 撮影

NO. 12

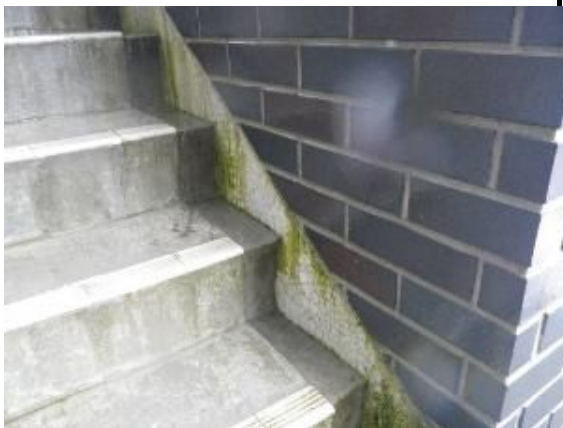

北面階段
巾木の進塗仕上げの乾燥収縮によるひび割れ

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影



下地補修+再塗装

撮影者 高坂 令和2年11月13日 撮影

是正前

是正後

NO. 13



北面階段
屋根からの降水により階段手摺天端の
仕上げ材が剥離する。

アルミ笠木取付

撮影者 高坂 令和2年3月18日 撮影

撮影者 高坂 令和2年12月3日 撮影

NO. 14



南面駐車場
サインポールの物損

町からの依頼。
協議により撤去（施工済み）

撮影者 高坂 令和1年12月2日 撮影

撮影者 高坂 令和1年12月11日 撮影

NO. 15



南面車寄せ
スロープ縁石モルタルの割れ

縁石撤去及び復旧

撮影者 高坂 令和1年8月19日 撮影

撮影者 高坂 令和2年10月31日 撮影

是正前

是正後

NO. 16



西面外壁
塗装剤の色むら

撮影者 高坂 令和1年8月19日 撮影

写真なし

再塗装

撮影者 撮影

NO. 17



南面 屋根
屋根材ジョイントの落下

撮影者 高坂 令和3年3月27日 撮影



嵌合式ジョイントの再取付

撮影者 高坂 令和3年8月26日 撮影

NO. 17



南面 屋根
屋根材ジョイントの落下

撮影者 高坂 令和3年3月27日 撮影



嵌合式ジョイントの再取付

撮影者 高坂 令和3年8月26日 撮影

是正前

是正後

NO. 17



南面 屋根
屋根材ジョイントの落下

嵌合式ジョイントの再取付

撮影者 高坂 令和3年3月27日 撮影

撮影者 高坂 令和3年8月26日 撮影

NO. 17



北面 屋根
屋根材ジョイントの落下

嵌合式ジョイントの再取付

撮影者 高坂 令和3年3月27日 撮影

撮影者 高坂 令和3年8月26日 撮影

NO. 18



東面 腰壁
薄塗材のクラック

エポキシ樹脂シール+撥水材塗装

撮影者 高坂 令和3年3月27日 撮影

撮影者 高坂 令和3年10月2日 撮影

是正前

是正後

NO. 19



車寄せ
薄塗材のクラック

撮影者 高坂 令和3年3月27日 撮影



エポキシ樹脂シール+撥水材塗装

撮影者 高坂 令和3年10月2日 撮影

NO. 20



ホール 北面出入口
手摺笠木の破損（町依頼）

撮影者 高坂 令和3年3月27日 撮影

別途対応

笠木の交換

撮影者 高坂 令和4年3月5日 撮影

NO. 21



ホール南面屋根
屋根の破損（町依頼）

撮影者 高坂 令和3年3月27日 撮影

別途対応

屋根の交換
※町依頼で見積提出済み

撮影者 撮影

是正前

是正後

NO. 22





車庫棟
南面内壁ケイカル板未施工

上部ケイカル板張り

撮影者 高坂 令和3年3月27日 撮影

撮影者 高坂 令和3年8月26日 撮影



NO.



撮影者 撮影

撮影者 撮影

NO.



撮影者 撮影

撮影者 撮影
